


岡山港浚渫工事現場説明資料

社内工事名	岡山港浚渫工事	
工事場所	岡山市 小串(他4箇所)	
工期	自平成19年7月25日 至平成19年10月31日	
発注者	岡山県備前県民局	
施工者	好ハナ工業株式会社	
工事内容	浚渫工 幸島地区 2,291m ³ 西米崎地区 332m ³ 向小串地区 2,877m ³ 水門湾地区 3,857m ³	土捨工 空気圧送揚土 9,357m ³ 仮係留施設設置L=100m 係留パイプ撤去・打設N=46本
現場事務所名	岡山港事務所	



着工前(向小串地区)


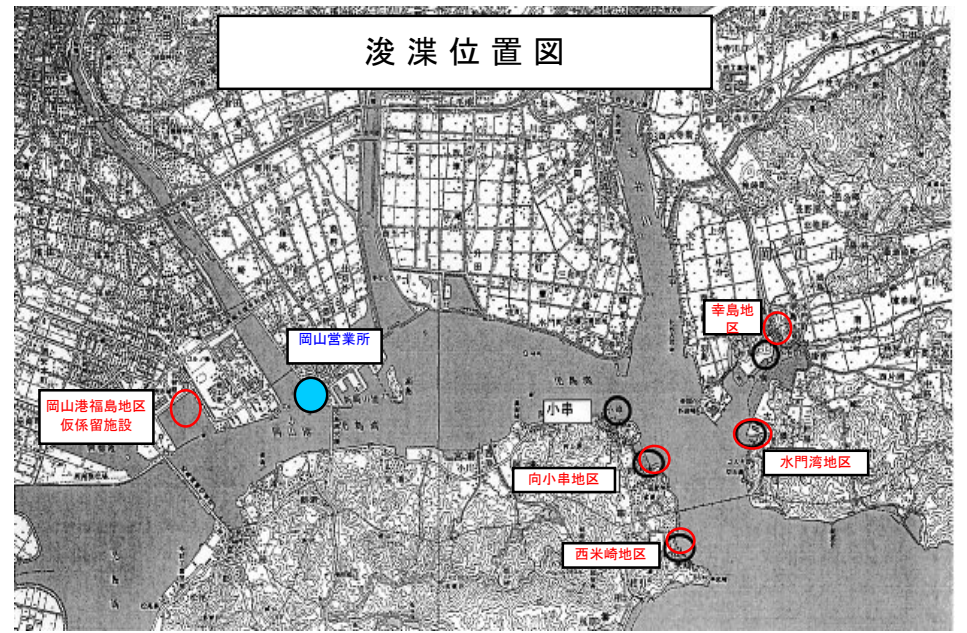


竣工(段階出来形検査)

使用船舶		
浚渫工		
ガットバージ船	3m ³ バケット	2隻
運搬工		
押船	1,800PS	2隻
土運船	1,300m ³ 積	4隻
土捨工		
空気圧送船		1隻
安全監視船		
警戒船		1隻

浚渫工

土捨工

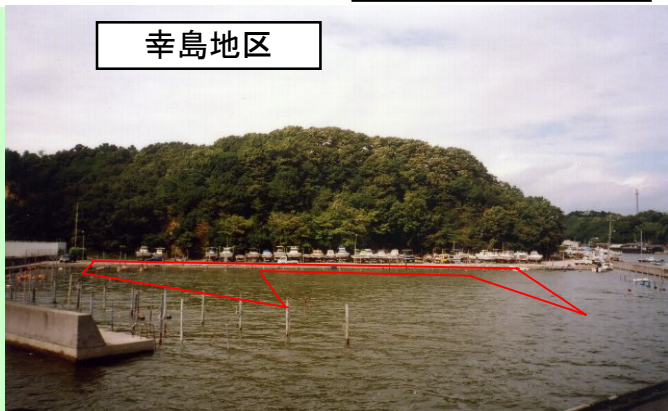

幸島地区




西米崎地区



浚渫土運搬状況




浚渫状況(幸島地区)

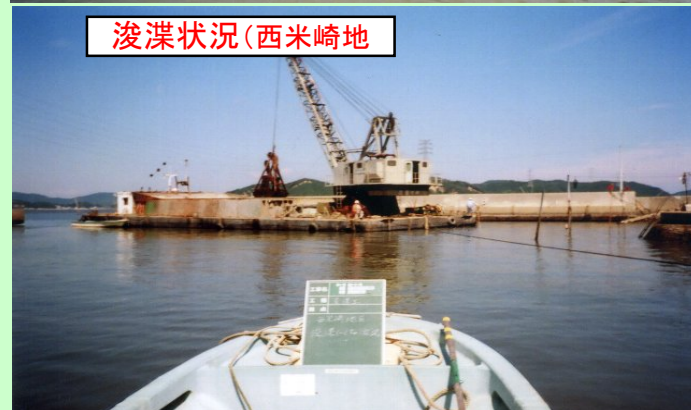

浚渫状況(西米崎地)




浚渫土空気圧送揚土



水門湾地区

岡山港福島地区
仮係留施設設置


一般船舶移動



係留パイプ引抜撤去



浚渫土揚土



係留パイプ打設

仮係留施設撤去
オイルフェンス設置



水門湾地区



仮係留施設設置



係留パイプ引抜撤去



浚渫状況



係留パイプ打設



オイルフェンス設置(不法係留防止策)
