


○工事概要

契約工事名	高松港朝日地区岸壁(-12m)工事
発注者	国土交通省 四国地方整備局
全体工期	平成19年11月2日 ~ 平成20年3月25日
指定部分工期	平成19年11月2日 ~ 平成20年1月10日
施工場所	香東川浄化センター内


○工事数量

工種名称	規格 形状寸法	単位	数量	摘要
本體工(ケーソン式)				
ケーソン製作工		函	2	
土工				
掘削工	レキ質土	m3	13,900	
盛土工		m3	14,000	
函台工				
函台製作工	RC-40	m2	17,615	t=100,200,400
構造物撤去工				
撤去工		式	1	
仮設工				
仮設排水溝	H=500	m	240	素堀側溝
仮設道路工	W=5.5	m2	294	T=300
敷鉄板設置工	3m*6m	枚	78	t=22
仮設配管工		式	1	
緑地工				
植生工		本	528	
安全管理		式	1	交通誘導員
後片付け工		式	1	

○施工位置図

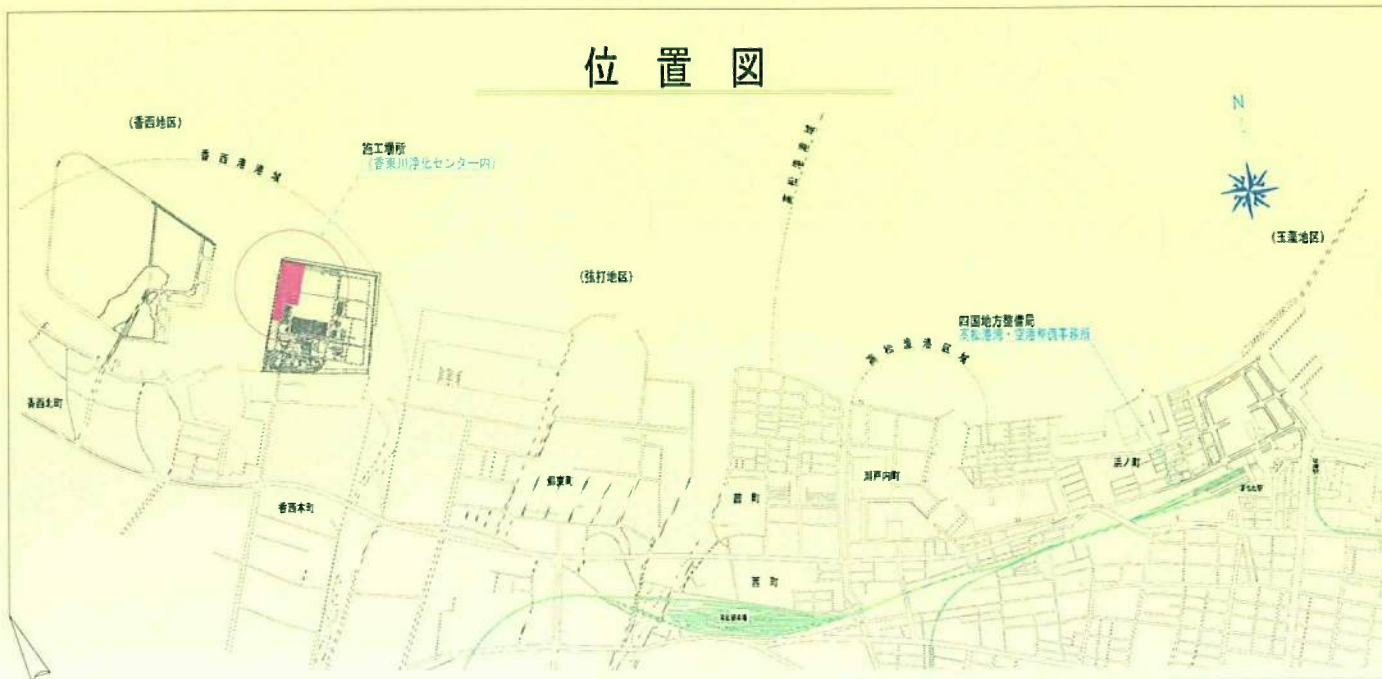

○工事フロー図

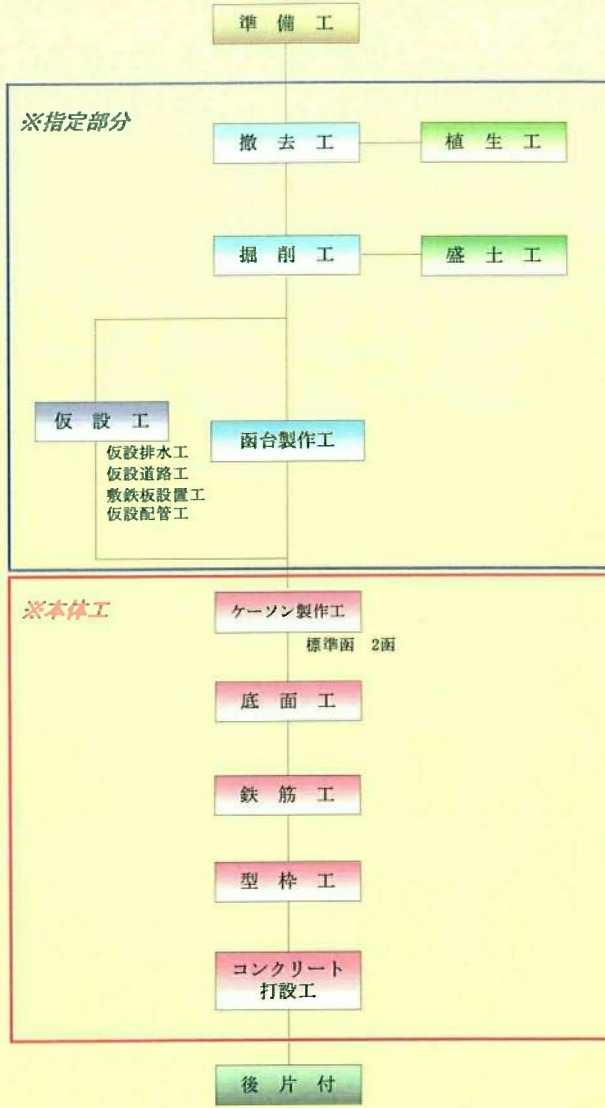

●工事写真



●ケーソン緒元



ケーソン高	14.80m
ケーソン幅	16.40m
ケーソン延長	15.95m
側壁厚	0.40m
隔壁厚	0.20m
底版厚	0.70m
フーチング長	1.50m
フーチング厚	0.80m
ハンチ長	0.20m

コンクリート打設高	
1層目	1.30m
2層目	2.70m
3層目	2.70m
4層目	2.70m
5層目	2.70m
6層目	2.70m

●指定部分工事状況写真



●本體工工事状況写真

