

鳥取港防波堤工事現場説明資料

竣工




水中竣工





工事名：鳥取港防波堤工事
工事場所：鳥取市港町（千代地区）及びその地先
工期：平成21年4月13日～平成21年8月30日
発注者：国土交通省中国地方整備局
契約先：東洋建設株式会社

工事概要：鳥取港沖防波堤の港外側に、大型消波ブロックの設置を主とする工事である。
 既設ブロックを撤去した後、捨石投入均し及び被覆ブロックの据付を施工する。
 吸出防止工 S=1,033㎡、洗掘防止工 S=1,967㎡、グラベルマット V=3,276㎡
 グラベルマット荒均し S=287㎡、基礎捨石工 V=8,013、荒均し S=2,275㎡
 被覆ブロック据付（8t～16t）N=311個 被覆ブロック撤去・仮置（16t,10型）N=182個

施工位置図

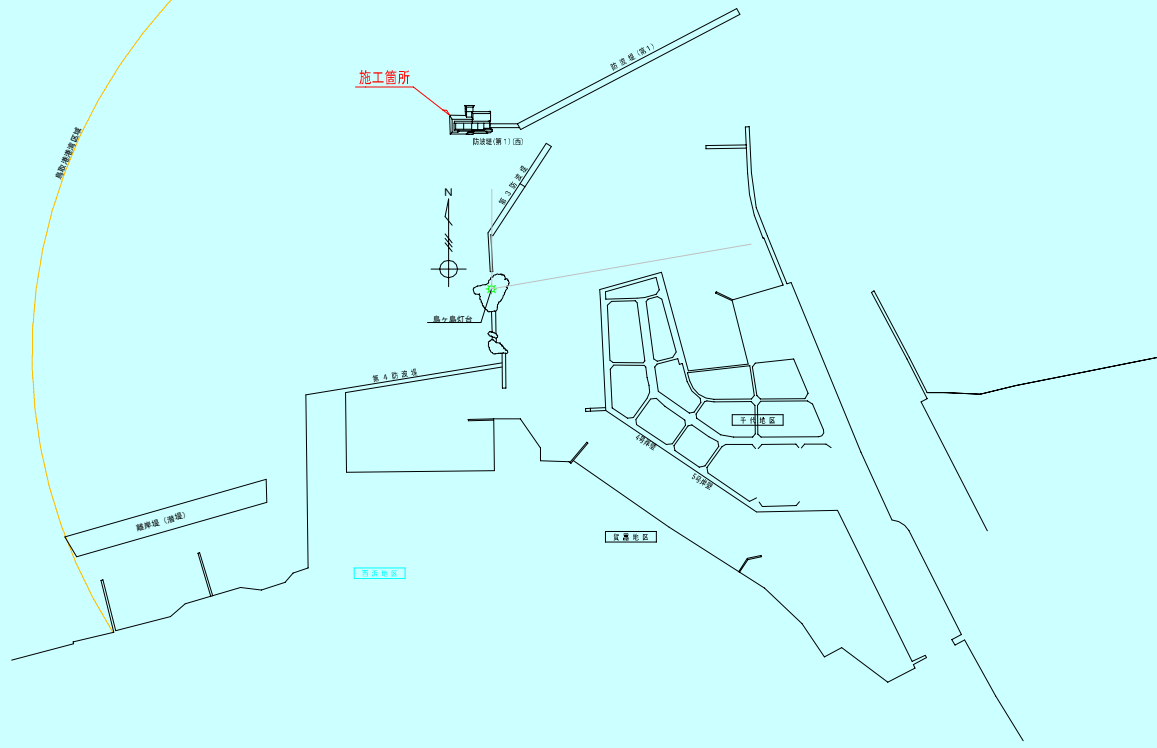

平面図

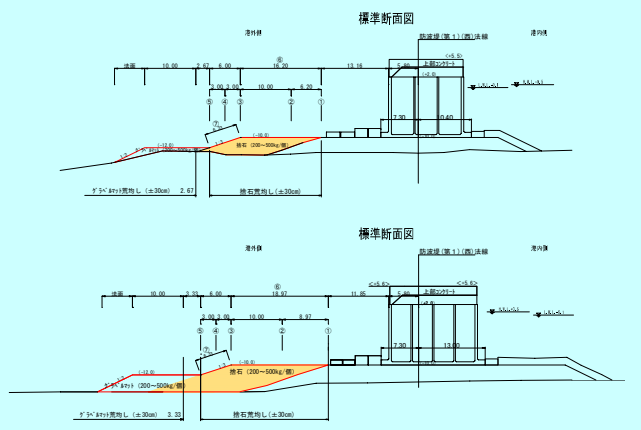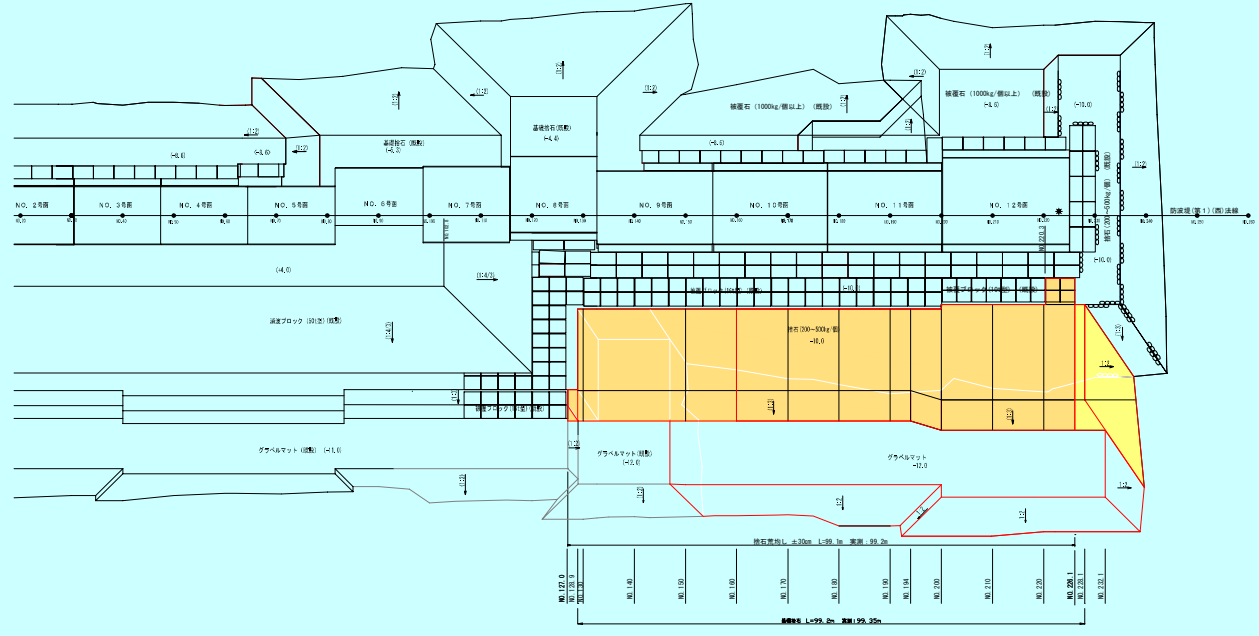

海上工事写真

- ブロック撤去工
- 洗掘防止マット工
- 基礎捨石投入
- 荒均し
- ブロック据付
- 工事竣工

①洗掘防止マット設置状況



②被覆ブロック撤去・仮置状況



③基礎捨石200～500kg投入状況



④グラベルマット投入状況




⑤基礎捨石荒均し状況



⑥荒均し状況（水中）



⑦技術提案履行設置状況（自動分離装置）

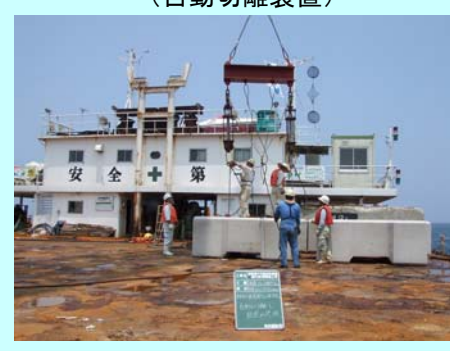

⑧被覆ブロック据付状況

