



# 宇野港護岸工事現場説明資料

契約工事名	公共 港湾工事
社内工事名	宇野港 護岸工事
工事場所	岡山県 玉野市
工期	自平成17年5月30日 至平成18年1月20日
発注者	岡山県備前県民局
施工者	好ハナ工業株式会社
工事内容	施工延長 L=139.2m
	本體工 L=139.2m L型ブロック製作 3基、据付18基
	裏込工 裏込石5,460m <sup>3</sup> 防砂シート敷設 448m <sup>2</sup>
	裏埋工 裏埋土23,485m <sup>3</sup>
現場事務所名	岡山営業所 宇野港作業所

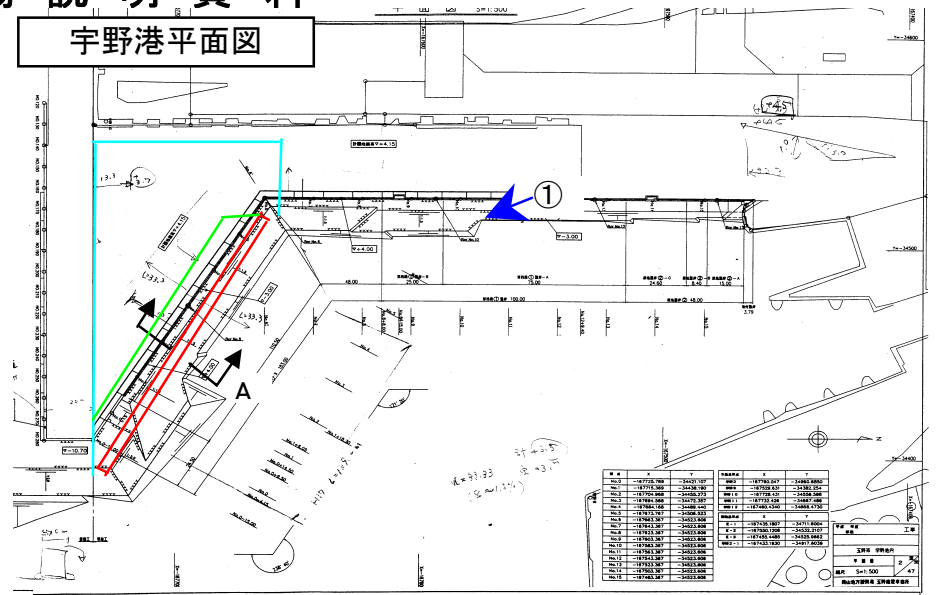

標準断面図 A-A

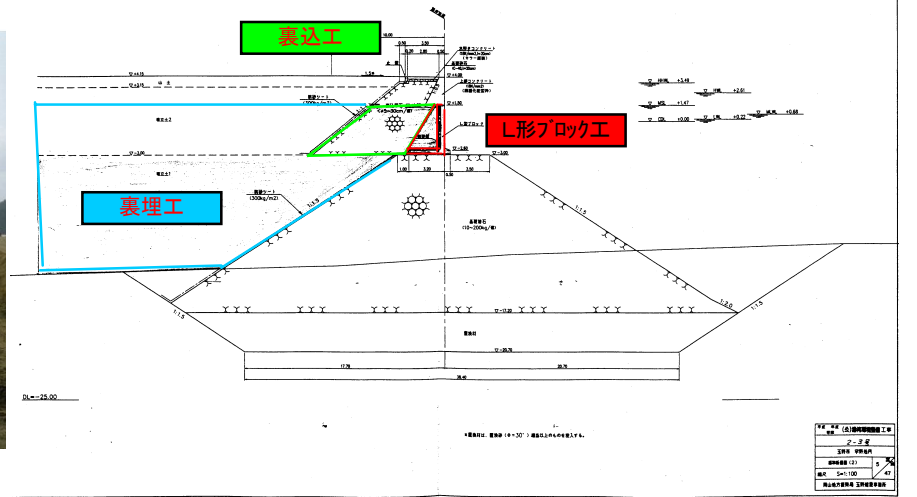

着工前 (平面図①から望む)



竣工 (平面図①から望む)



L型ブロック製作

L型ブロック横持ち

L型ブロック据付

防砂目地板取付け

裏込材投入・均し

防砂シート敷設

裏埋材投入・均し



L型ブロック製作状況



L型ブロック横持状況



L型ブロック据付状況



防砂目地板取付状況



裏込材投入状況



裏込材均し状況



防砂シート敷設状況



裏埋材投入状況



裏埋材敷均し状況
